


Fahrplan Drei Wellen, keine Gleichzeitigkeit

Vier Quartale, sieben Vorhaben. Die Grundlagenarbeit steht als eigene Spur neben den Anwendungsfällen — sie ist kein Vorspiel, sondern der Teil, der die späteren Wellen billiger macht. Gestrichelte Linien zeigen, was worauf wartet.



DER KRITISCHE PFAD

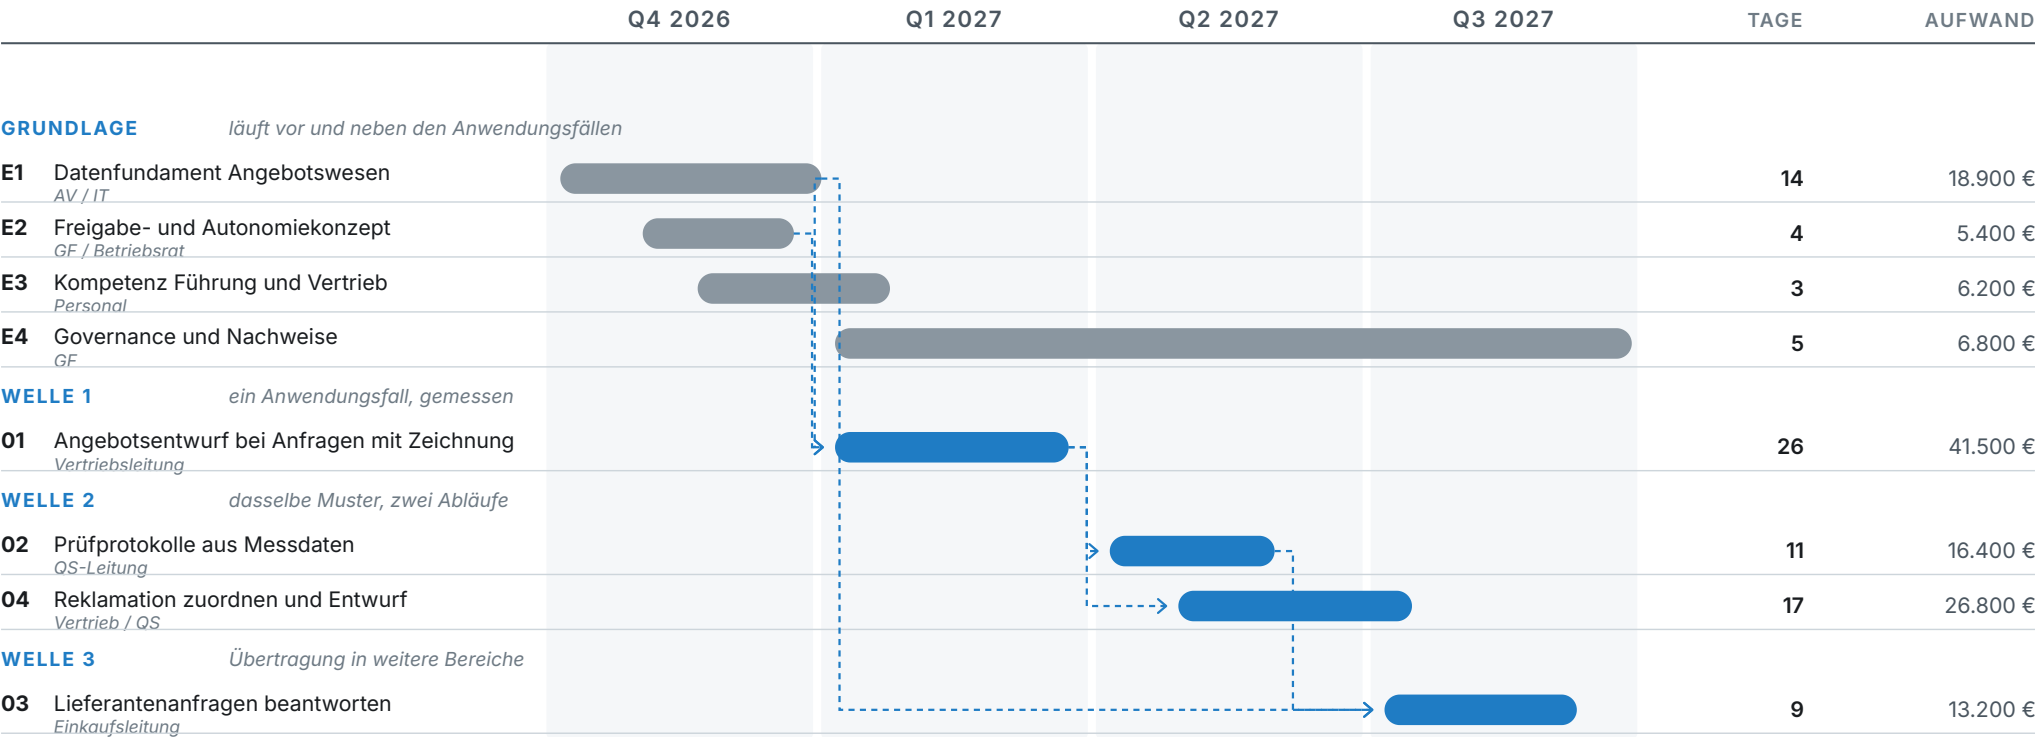

Verzögert sich E1, verschiebt sich alles. Das ist die einzige Abhängigkeit, die den Gesamttermin bewegt — die übrigen haben Puffer. Deshalb beginnt E1 in der ersten Woche und nicht parallel zum ersten Anwendungsfall.

WAS WIR BEWUSST NICHT TUN

Kein zweiter Anwendungsfall vor der Messung des ersten. Keine Ausweitung auf weitere Bereiche vor der Übergabe von Welle 1. Und keine Werkzeugentscheidung vor E2 — die Freigabelogik bestimmt, was überhaupt in Frage kommt.

SUMME

Grundlage	26 Tage	37.300 €
Anwendungsfälle	63 Tage	97.900 €
Gesamt	89 Tage	135.200 €

Netto. Aufwände sind geschätzt; verbindlich wird je Anwendungsfall nach der Eingrenzung abgerechnet.
